



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filpo, 26 - C.A.P. 85040
Tel.0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comuneviggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL ALL'INTERNO DELL'IM- PIANTO SPORTIVO IN LOC. PEZZO LA CORTE NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
15	DATA:	CRONOPROGRAMMA LAVORI
	SCALA	
PROGETTO ESECUTIVO		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Geom.Vincenzo ATTADIA)  
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE PRON. EL. N. ANNO 04 2025		

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

Viggianello, 01/04/2025



Il Tecnico

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **60** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 23'212,52 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 46'425,03 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Viggianello, 01/04/2025



Il Tecnico

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)


Viggianello, 01/04/2025




Il Tecnico



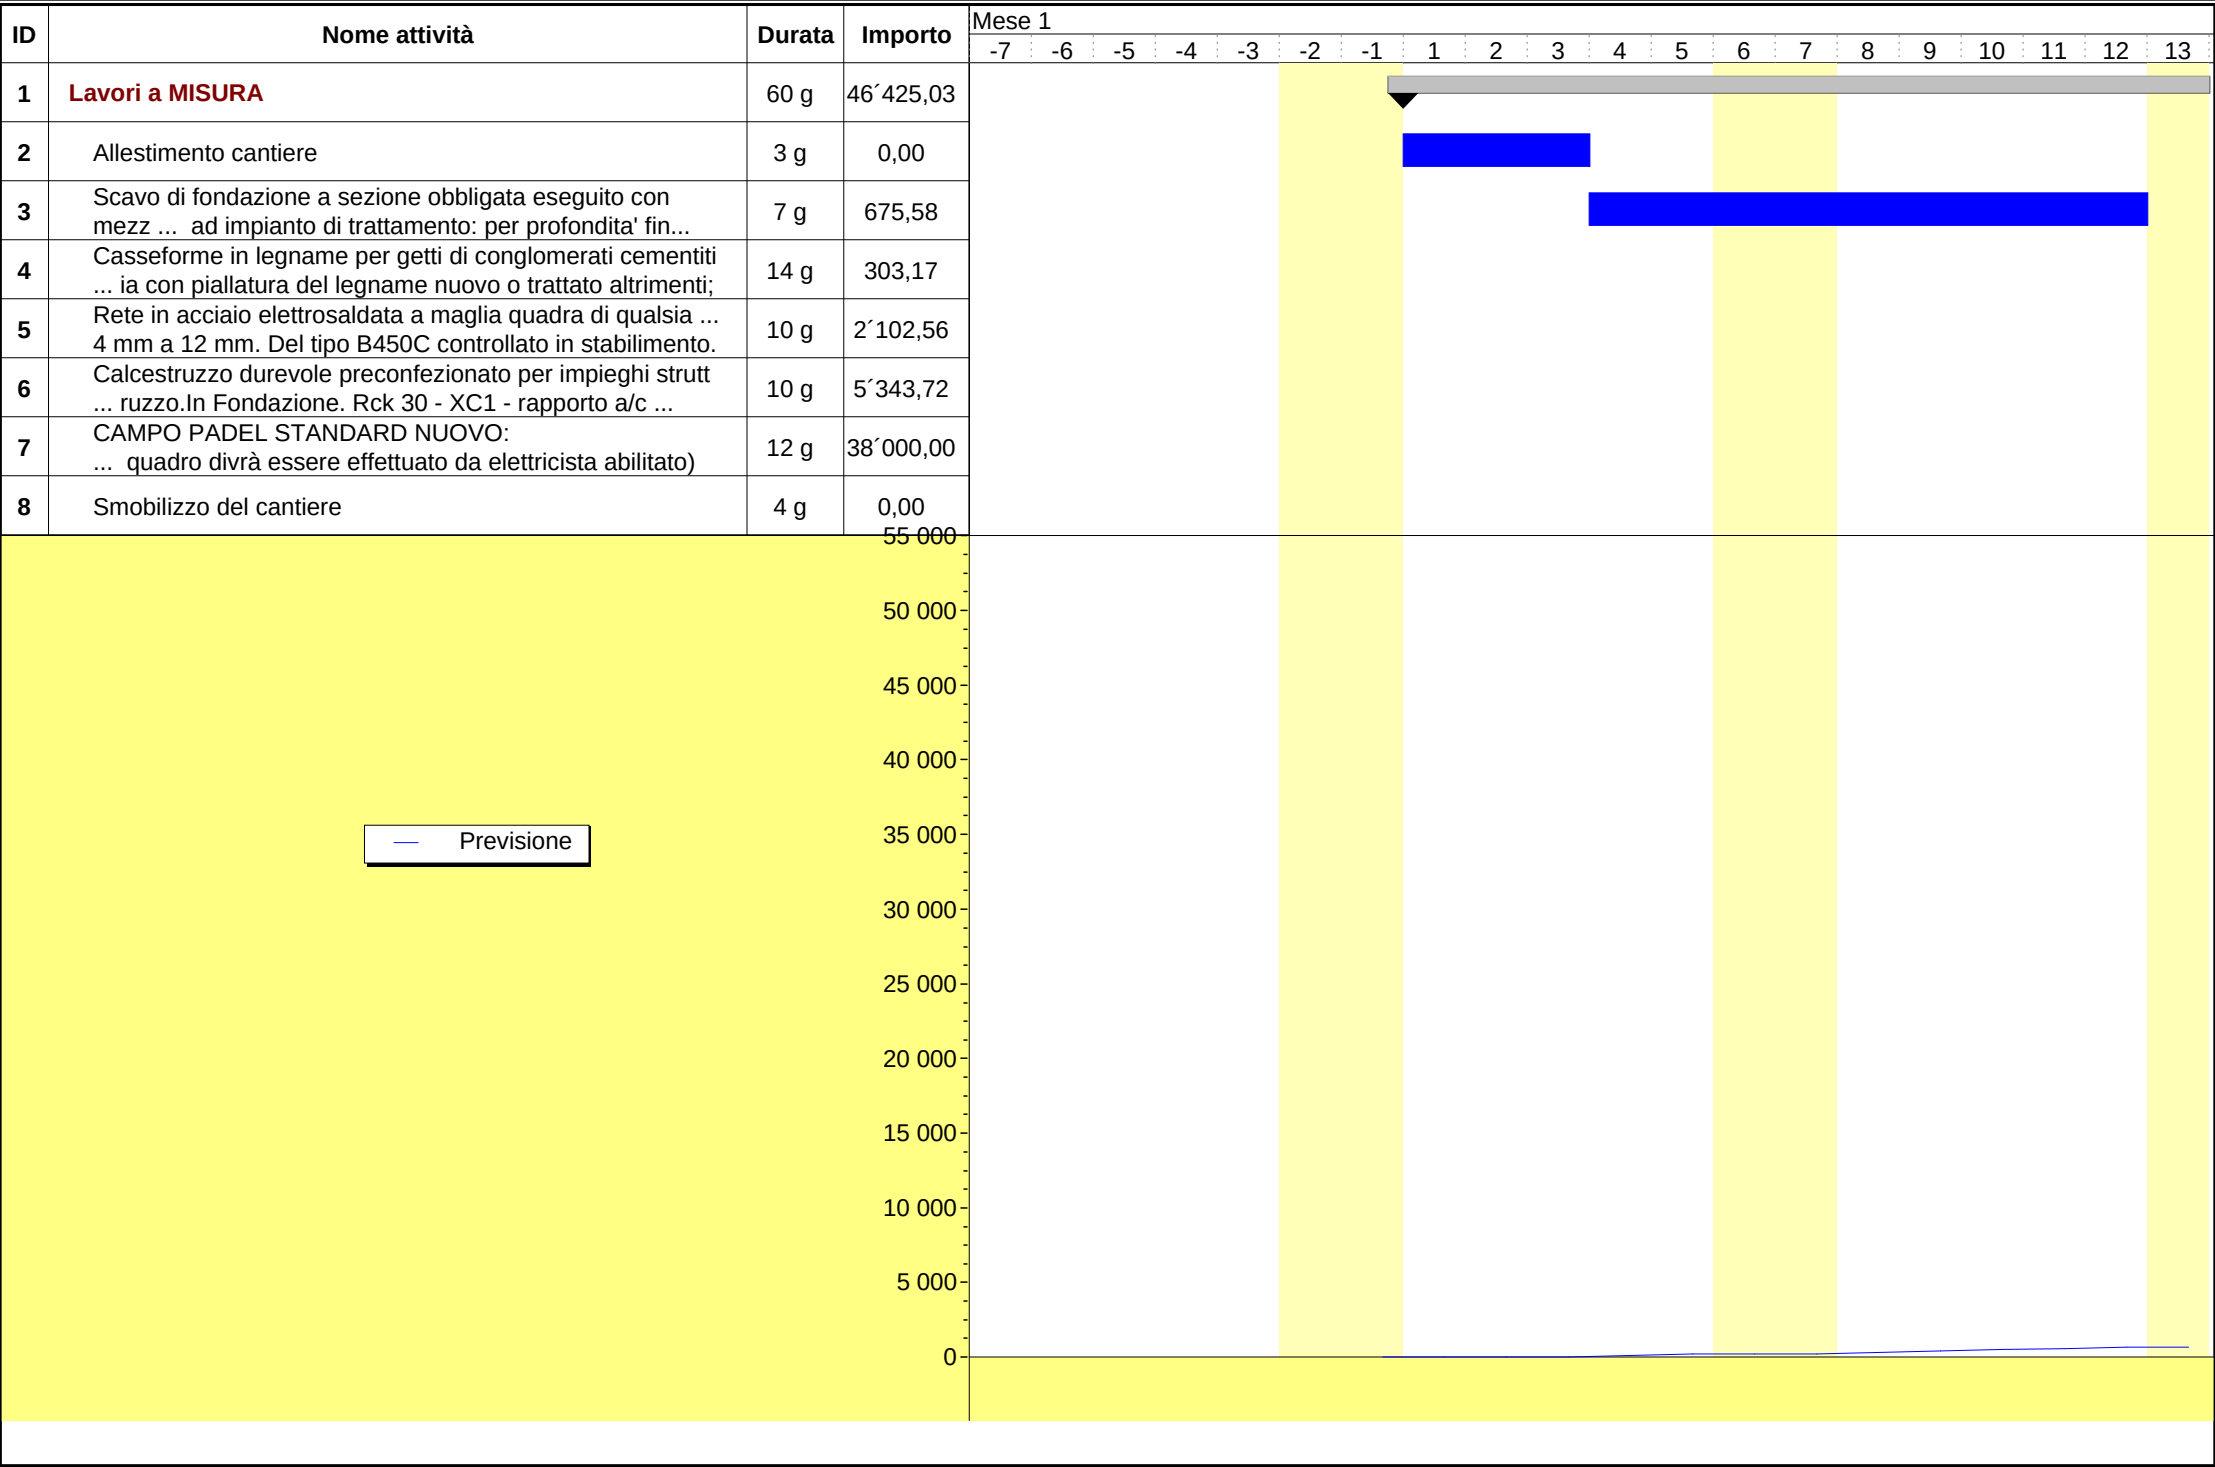

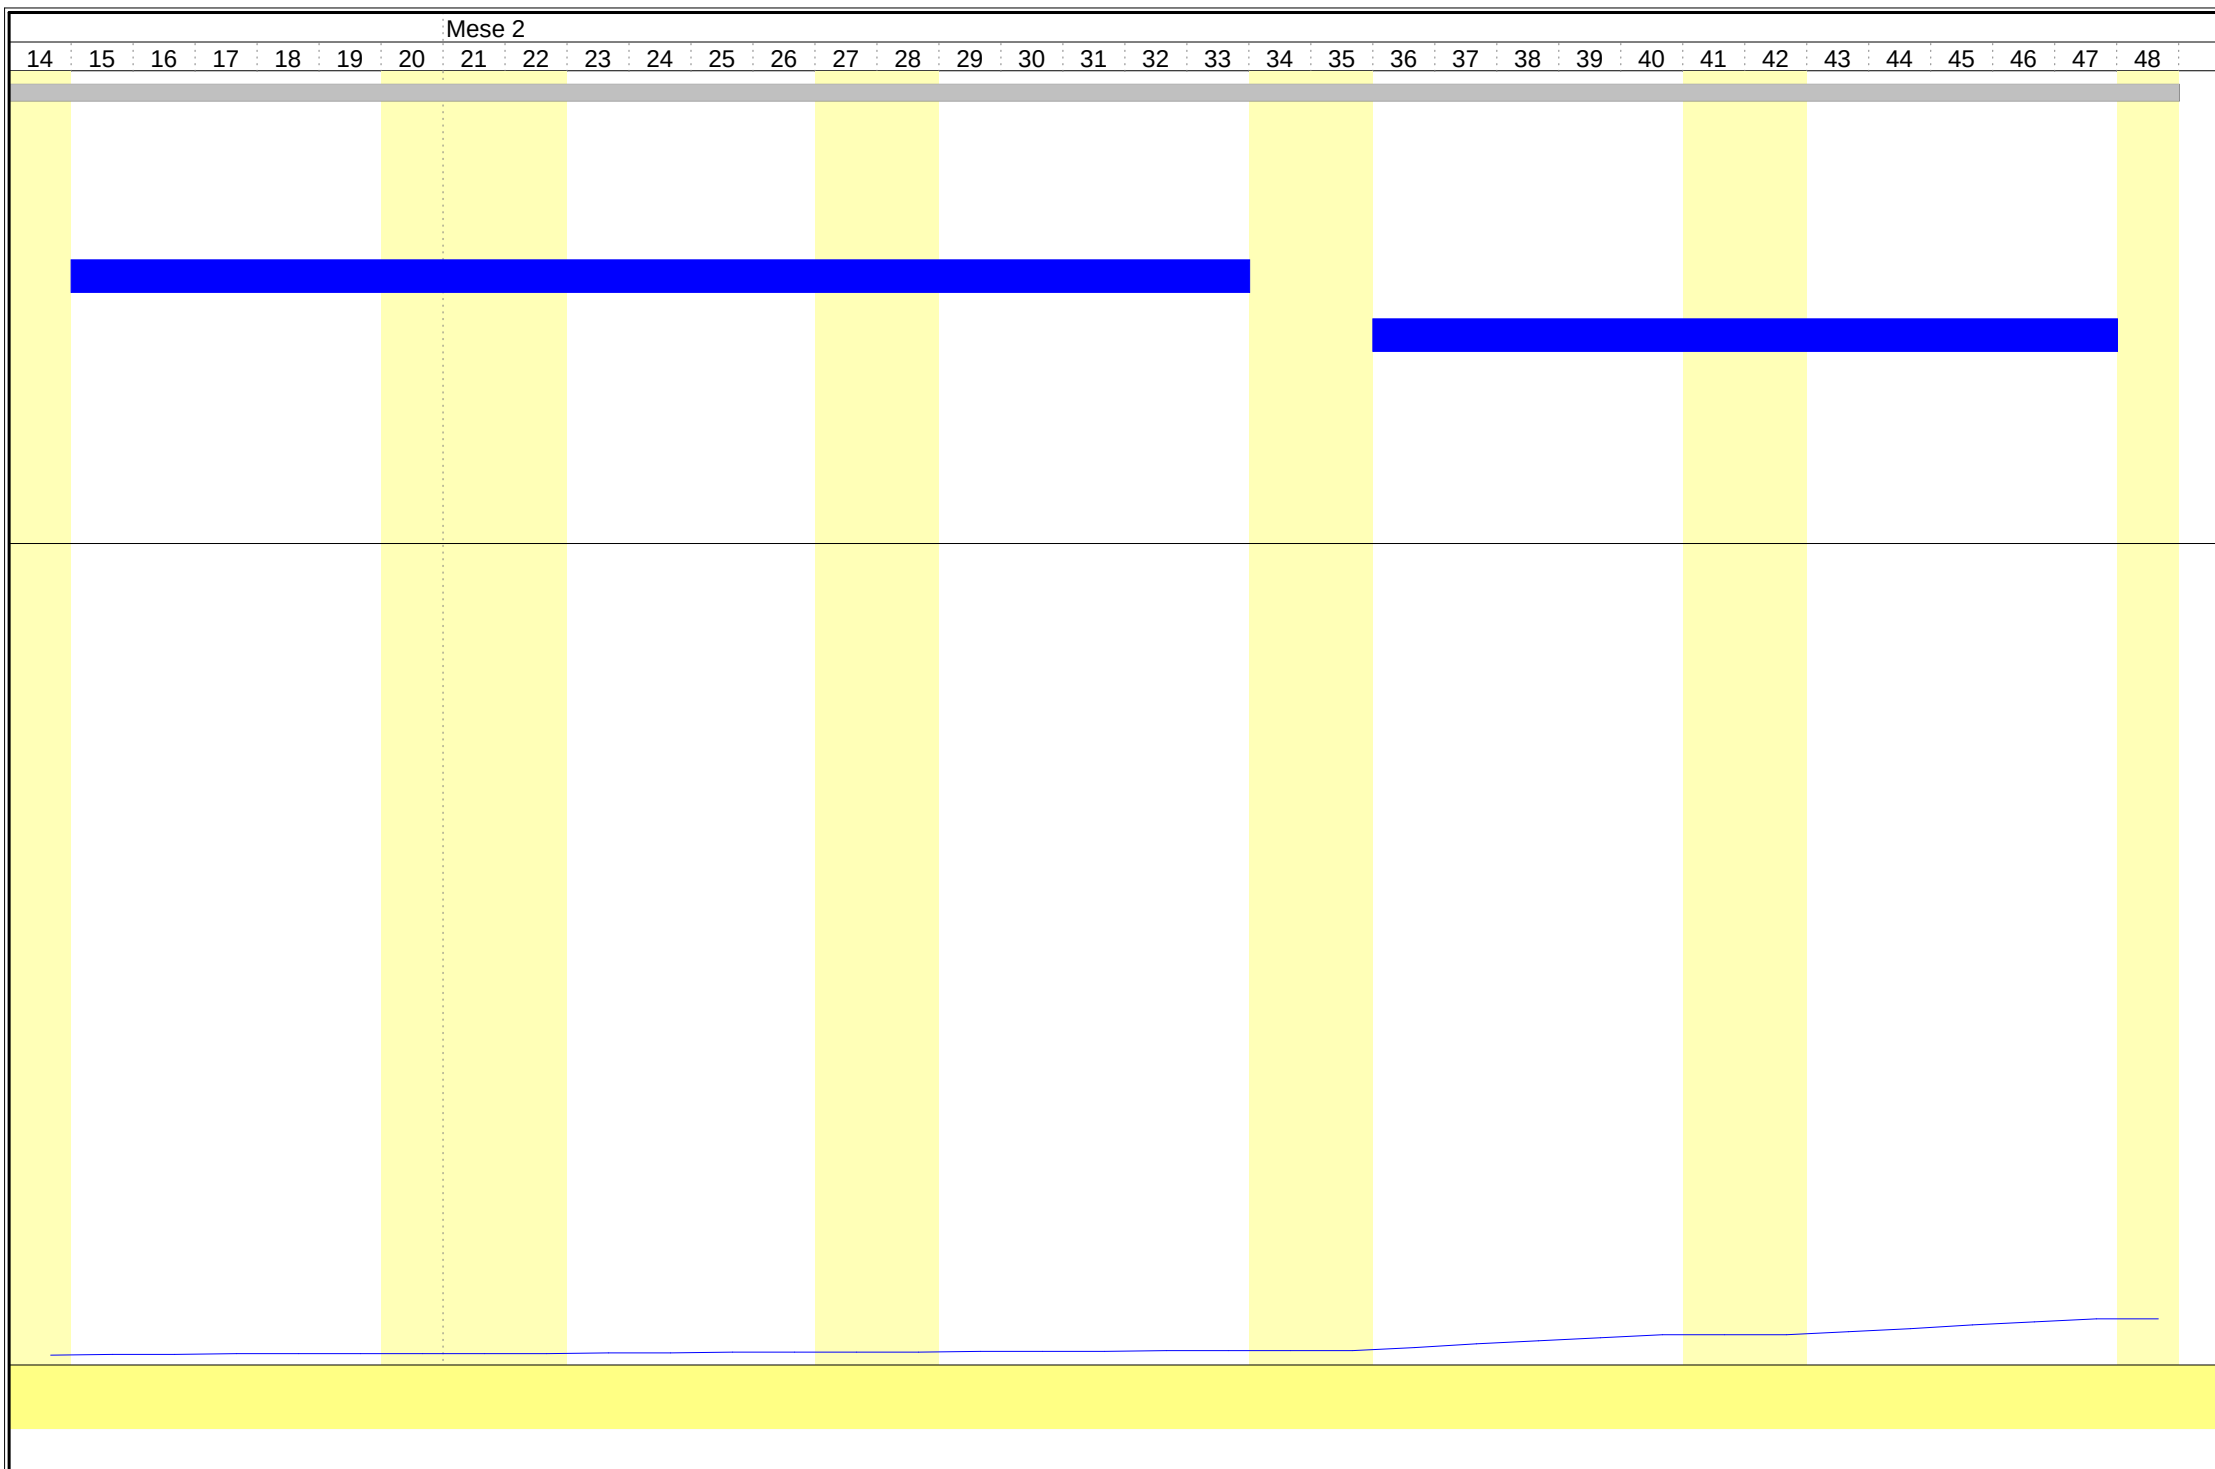

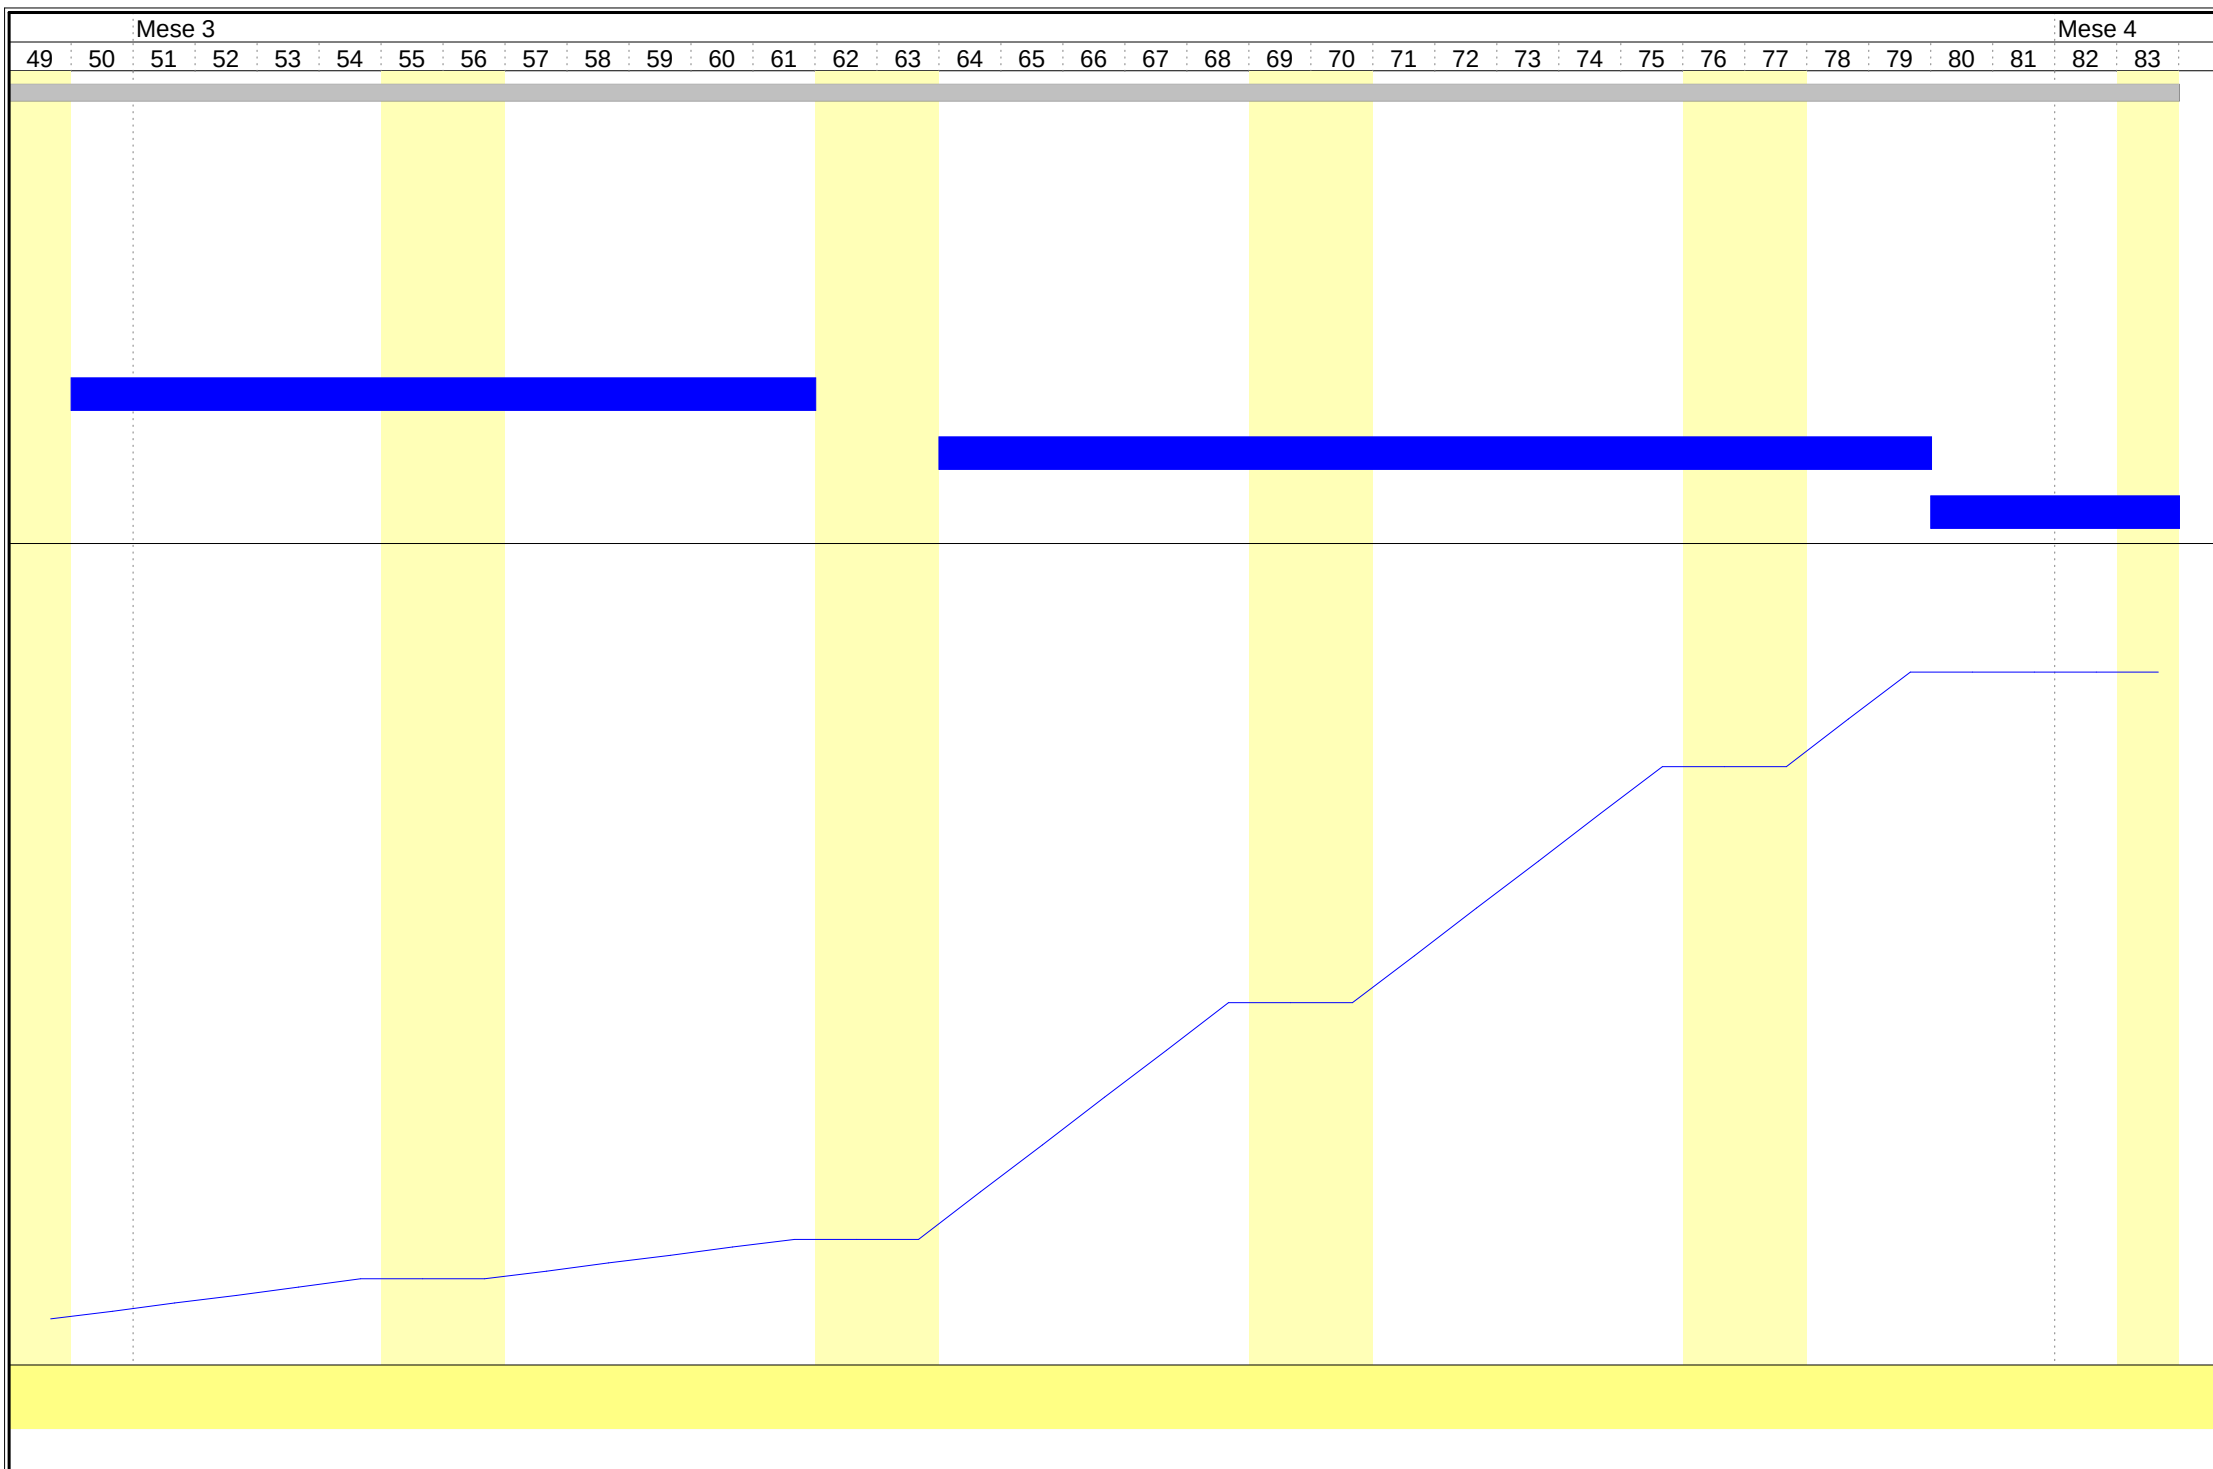

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

Viggianello, 01/04/2025



Il Tecnico

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	46'425,03	100,000	1 gg	85 gg	60	85
* Allestimento cantiere	0,00	0,000	1 gg	3 gg	3	3
* Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezz ... ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;	675,58	1,455	4 gg	12 gg	7	9
* Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti ... ia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;	303,17	0,653	15 gg	33 gg	14	19
* Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia ... 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.	2'102,56	4,529	36 gg	47 gg	10	12
* Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutt ... ruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.	5'343,72	11,510	50 gg	61 gg	10	12
* CAMPO PADEL STANDARD NUOVO: ... quadro divrà essere effettuato da elettricista abilitato)	38'000,00	81,852	64 gg	79 gg	12	16
* Smobilizzo del cantiere	0,00	0,000	80 gg	85 gg	4	6

Viggianello, 01/04/2025



Tecnico

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

Viggianello, 01/04/2025



Il Tecnico

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
4 gg	96,51	96,51	0,208
5 gg	96,51	193,02	0,416
8 gg	96,51	289,53	0,624
9 gg	96,51	386,04	0,832
10 gg	96,51	482,55	1,039
11 gg	96,51	579,06	1,247
12 gg	96,51	675,57	1,455
15 gg	21,65	697,23	1,502
16 gg	21,65	718,88	1,548
17 gg	21,65	740,54	1,595
18 gg	21,65	762,19	1,642
19 gg	21,65	783,85	1,688
23 gg	21,65	805,50	1,735
24 gg	21,65	827,16	1,782
25 gg	21,65	848,81	1,828
26 gg	21,65	870,47	1,875
29 gg	21,65	892,12	1,922
30 gg	21,65	913,78	1,968
31 gg	21,65	935,43	2,015
32 gg	21,65	957,09	2,062
33 gg	21,65	978,74	2,108
36 gg	210,26	1'188,99	2,561
37 gg	210,26	1'399,25	3,014
38 gg	210,26	1'609,51	3,467
39 gg	210,26	1'819,76	3,920
40 gg	210,26	2'030,02	4,373
43 gg	210,26	2'240,28	4,826
44 gg	210,26	2'450,53	5,278
45 gg	210,26	2'660,79	5,731
46 gg	210,26	2'871,04	6,184
47 gg	210,26	3'081,30	6,637
50 gg	534,37	3'615,68	7,788
51 gg	534,37	4'150,05	8,939
52 gg	534,37	4'684,42	10,090
53 gg	534,37	5'218,79	11,241
54 gg	534,37	5'753,17	12,392
57 gg	534,37	6'287,54	13,543
58 gg	534,37	6'821,91	14,694
59 gg	534,37	7'356,28	15,846
60 gg	534,37	7'890,65	16,997
61 gg	534,37	8'425,02	18,148
64 gg	3'166,67	11'591,69	24,969
65 gg	3'166,67	14'758,36	31,790

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
66 gg	3'166,67	17'925,02	38,611
67 gg	3'166,67	21'091,69	45,432
68 gg	3'166,67	24'258,36	52,253
71 gg	3'166,67	27'425,02	59,074
72 gg	3'166,67	30'591,69	65,895
73 gg	3'166,67	33'758,36	72,716
74 gg	3'166,67	36'925,02	79,537
75 gg	3'166,67	40'091,69	86,358
78 gg	3'166,67	43'258,36	93,179
79 gg	3'166,67	46'425,03	100,000
Viggianello, 01/04/2025			
Tecnico			
 			
